



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ADYAMAN MART 2016

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu	2
1. Genel Değerlendirme	3
Misyön ve Vizyon	3
Stratejik Amaç ve Hedefler	4
1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları	6
1.2. Hizmet Kapasitesi	7
1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme	11
2015 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı	13
2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları	14
2.1. Devam Eden Projeler	14
2.1.1. Kamu Yatırımları Projeleri	14
3. Öneriler	23
2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	24
2015 Yılı Eğitim Sektörü	
2015 Yılı Sağlık Sektörü	

Üst Yönetici Sunuşu:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 25. Maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemizin 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin harcama ve yatırımların gerçekleşme durumları ile yürütülen çalışmaların içeriği açıklanmaktadır.

2015 Yılı Yatırım Programının da yer alan işlerden Enstitüler Binası, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve 18 Daireli Personel Lojmanı yapım işleri bitirilerek hizmete açılmıştır. Programda yer alan işlerden Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Mühendislik Fakültesi, Teknik Bilimler MYO, Eğitim Fakültesi Ek Binası yapım işlerinde % 80'lere varan fiziki gerçekleştirmeler sağlanmış olup bu işlerin 2016 yılı içerisinde hizmete açılması hedeflenmiştir.

Kampüs altyapısı projesi kapsamında Bağlantı köprüsü, Adıyaman evi, Hasancık idari binası, merkez kampüsü altyapı işleri, kampüs içi yol ve kaldırım yapım işi, Çevre düzenleme işleri yapılan sözleşmeler kapsamında tamamlanmıştır.

Spor sektörü kapsamında yapımı önceki yıllarda tamamlanan Çim Yüzeyle Futbol Sahasına 1000 Seyirci Kapasiteli Tribün yapım işi devam etmekte olup 2016 yılı içerisinde bitirilmesi beklenmektedir.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında, akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları ile elektronik ve basılı yayın alımları karşılanmış, eğitim-öğretim altyapısı yeni kurulan bilgisayar laboratuvarlarıyla güçlendirilmiştir.

Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan Uygulama ve Araştırma Merkezi tıbbi cihazları temin edilerek Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti vermeye başlanmıştır.

Üniversitemizin bilimsel araştırmalar projeler kapsamında akademik birimlerimizin geçmiş yıllardan devam eden 203 proje ile birlikte 2015 yılında 59 proje desteklenerek 262 projenin 46'sı sonuçlandırılmıştır.

Üniversitemize; eğitim, sağlık, spor ve bilimsel araştırmalar sektörlerinde 2015 yılı yatırımları için 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle toplam 25.550.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 15.777.000,00-TL ekleme işlemi ile % 62 oranında artırılarak toplam 41.327.000,00-TL'ye çıkarılmıştır. Yılı içerisinde 36.441.530,33-TL yatırım harcaması gerçekleştirilerek yatırım ödeneklerinin kullanımı % 88 oranında gerçekleştirilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Üniversitemizin gelişimi ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen personele teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Rektör

1

GENEL DEĞERLENDİRME

Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektedir.



Bilgi, ürün ve hizmet üreterek sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir üniversite olmak.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER



2015-2019 STRATEJİK PLAN AMAÇ-HEDEF TABLOSU

Amaç	Hedef
A 1: Geleceği karşılayan eğitim ve öğretimin nitelik ve nicelik açısından kalitesini yükseltmek	H1: Üniversitemiz birimlerinde kullanılan makine teçhizat ve donatım ihtiyaçlarının teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleştirilmesi
	H2: Üniversitemiz akademik kadrosunun nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi
	H3: Üniversitemiz idari kadrosunun nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi
	H4: Bilimsel gelişmeler doğrultusunda eğitim hizmetinin sayısı ve çeşitliliğinin artırılması
	H5: Ek eğitim öğretim hizmetlerinin artırılması
A 2: Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sayı ve kalitesini arttırmak	H1: Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yapılması
	H2: Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığının arttırılması
	H3: Proje faaliyetlerinin artırılması
	H4: Teknogirişim altyapısının oluşturulması
A 3 Öz Gelirlerimizi arttırmak ve Bütçe Ödeneklerini etkin/verimli kullanılmasını sağlamak	H1: Döner sermaye işletmesinin gelirlerinin artırılması
	H2: Bağış ve sponsorluk gelirlerinin artırılması
	H3: Taşınmaz gelirlerin arttırılması
	H4: Kaynak kullanımında tasarrufun arttırılması
	H5: AR-GE faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin arttırılması
	H6: Diğer faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin arttırılması
A 4 Kurumsal alt ve üst yapıyı güçlendirmek ve geliştirmek	H1: ADYÜ Merkez Yerleşkesinde plan süresince Akademik ve İdari Birimlerin kapalı alan ihtiyacının karşılanması
	H2: Merkez ve İlçe Yerleşkelerinin alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin tamamlanması
	H3: 2015-2019 plan dönemi sonuna kadar Bina Büyük Onarımların gerçekleştirilmesi

2015-2019 STRATEJİK PLAN AMAÇ-HEDEF TABLOSU

Amaç	Hedef
A 5 Kurum kültürü bilincini yerleştirmek ve öğrenen organizasyon yapısını sürdürülebilir kılmak	H1: Üniversitemizde 'Akademik ve İdari Performans Sistemi'nin oluşturulması
	H2: Kurum kimliği ve kurum kültürünün geliştirilmesi
A 6 Kurumsal Yönetim Sistemlerinin oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak	H1: Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
	H2: Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi yönetim sistemini oluşturmak
	H3: OHSAS 18001 Sisteminin oluşturulması
	H4: Bilgi Güvenliği Sisteminin oluşturulması
	H5: Laboratuvar Akreditasyon Standardının oluşturulması
	H6: Çevre Yönetim Sisteminin oluşturulması
A 7 Toplumsal fayda sağlayacak hizmet ve ürünler sunmak, geliştirmek	H1: Bölgeye yönelik projelerin sayı ve kalitesinin artırılması
	H2: Üniversite - Sanayi işbirliği faaliyetlerinin artırılması
	H3: Toplumun dezavantajlı kitleleri için faaliyetlerin artırılması
	H4: Sosyal sorumluluk proje faaliyetlerinin artırılması
A 8 Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini üst seviyede tutmak ve devamlı tercih edilebilir bir Üniversite olmak	H1: İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi.
	H2: Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimlerinin sağlanması.
	H3: Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve mezunlarla işbirliğini geliştirmek
	H4: Tüm Birimlerde topluma yönelik sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi

1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanakları:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendin de Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli bir Kurum olup, yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir.

I) Finansman Kaynakları:

Gelirlerimiz:

A) Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

2) İkinci Öğretim Gelirleri

3) Örgün Öğretim Gelirleri

4) Hizmet Gelirleri

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Farabi

d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

II) Yasal Dayanaklar:

-2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları

-2547/ ek 27. Maddesine göre tezsiz yüksek lisans gelirleri,

-2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,

-3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri,

-2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri,

-4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış gelirleridir.

1.2. Hizmet Kapasitesi

Üniversitemiz merkez kampüs alanı Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesinde yer almaktadır. Gölbaşı, Kâhta, Besni İlçelerinde ise Meslek Yüksekokullarının bulunduğu yerleşkeler mevcuttur.

Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yerleşkeler	Mülkiyet Durumu	Toprak Alanı (m ²)
Merkez Yerleşkesi	Üniversite	1.087.460
Rektörlük Binası Alanı	Tahsis	6.053
Sağlık Yerleşkesi 1	Üniversite	5.263
Sağlık Yerleşkesi 2	Üniversite	4.754
Gölbaşı Yerleşkesi	Üniversite	26.429
Besni Yerleşkesi	Tahsis	588.629
Kahta Yerleşkesi	Tahsis	425.678
Hasancık Tarımsal Uygulama Alanı	Tahsis	143.430
Samsat İlçesi	Tahsis	50.000
	TOPLAM	2.337.696

Merkez kampüs içerisinde personel lojmanları, kafeterya, kapalı spor salonu ve açık hava spor tesisleri, merkezi araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Merkez kampüs alanı dışında şehir merkezinde üniversitemiz sağlık yerleşkesi bulunmakta olup toplam alanı 10.017 m²'dir. Sağlık yerleşkesinde Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi hizmetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemiz Kâhta Meslek Yüksekokulu, Kâhta İlçesinde 425.678 m² alan üzerinde, Besni Meslek Yüksekokulu Besni İlçesinde 793.479 m² alan üzerinde, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Gölbaşı İlçesinde 26.429 m² alan üzerinde eğitim öğretim hizmetini sürdürmektedir. Ayrıca Hasancık Tarımsal Uygulama Alanında 143.430 m² ve Samsat İlçesinde 50.000 m² alan bulunmaktadır.

ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE KAPALI ALANLAR		
YER	TOPLAM ALAN (m2)	KAPALI ALAN (m2)
Merkez Yerleşke Alanı Toplamı	1.087.460	117.204
Adiyaman Meslek Yüksekokulu		3.200
Adiyaman MYO Bilgisayar Laboratuvarı ve Makine Atölyesi		780
Adiyaman MYO Kantini		145
Bekleme Salonu		105
Merkezi Araştırma Laboratuvarı		2.600
Sağlık Yüksekokulu		4.055
SYO Kantini		144
Sosyal Tesisler		4.700
Öğrenci İşleri		675
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		5.157
Kapalı Spor Salonu		5.190
Lojmanlar		4.966
Mediko Sosyal Binası		15.412
Merkezi Atölye Binası		2.564
Tören Alanı ve Kulis Binası		100
Eğitim Fakültesi		5.829
Güzel Sanatlar Fakültesi		3.234
Merkezi Derslikler		33.529
MYO Uygulama Oteli		2.500
Merkezi Derslik Ofis Binası		8.715
Kreş		1.251
Gençlik Evi		222
Teknik Bilimler M.Y.O. Okuma Salonu		280
Enstitüler Binası		3.536
Kapalı Yüzme Havuzu		5.190
Adiyaman Evi		280
Yeni Lojman Bloku		2.845
Rektörlük Binası	6.053	7.065
Besni Meslek Yüksekokulu	588.629	4.500
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu	26.429	7.676
Kâhta Meslek Yüksekokulu	425.678	7.038
Tıp Fakültesi Hastaneleri Toplamı	10.017	29.417
Hastane 1. Etap	5.263	16.772
Hastane 2. Etap	4.754	12.645
Hasancık Tarımsal Uygulama Alanı	143.430	
Hasancık İdari Bina		154
Samsat İlçesi	50.000	
TOPLAM	2.337.696	173.054

2015 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde, 832 akademik personel, 560 idari personel olmak üzere toplam 1392 personel ile hizmet sunulmaktadır.

ÜN VAN	Sayısı
Profesör	36
Doçent	46
Yard. Doçent	268
Öğretim Görevlisi	133
Okutman	31
Araştırma Görevlisi	304
Uzman	14
TOPLAM	832

İDARİ PERSONEL	Sayısı
Genel İdari Hizmetler	278
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	168
Teknik Hizmetler Sınıfı	82
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	0
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	4
Din Hizmetleri Sınıfı	0
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	28
TOPLAM	560

İLÇE/ MERKEZ	Birim Adı	Normal Öğretim			İkinci Öğretim			Genel Öğrenci Sayıları		
		Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
İLÇE BİRİMLERİ	Besni M.Y.O.	739	719	1458	343	330	675	1082	1049	2133
	Gölbahı M.Y.O.	301	295	596	164	84	248	465	379	844
	Kahta M.Y.O.	740	409	1149	225	153	378	965	562	1527
	Meslek Yüksekokullar Toplamı	1780	1423	3203	732	567	1301	2512	1990	4504
MERKEZDEKİ BİRİMLER	Sağlık Hizmetleri M.Y.O.	171	419	590	12	105	117	183	524	707
	Sosyal Bilimler M.Y.O.	684	505	1189	552	297	849	1236	802	2038
	Teknik Bilimler M.Y.O.	1271	421	1692	1072	201	1273	2343	622	2965
	Meslek Yüksekokullar Toplamı	2126	1345	3471	1636	603	2239	3762	1948	5710
	Beden Eğitimi ve Spor Y.O.	115	56	171	0	0	0	115	56	171
	Sağlık Yüksekokulu	188	519	707	0	0	0	188	519	707
	Turizm İşlet. ve Otl. Y.O	242	152	394	0	0	0	242	152	394
	Yüksekokullar Toplamı	545	727	1272	0	0	0	545	727	1272
	Devlet Konservatuvarı	41	43	84	0	0	0	41	43	84
	Eczacılık Fakültesi	22	40	62	0	0	0	22	40	62
	Eğitim Fakültesi	800	1429	2229	194	264	458	994	1693	2687
	Fen Edebiyat Fakültesi	587	619	1206	376	417	793	963	1036	1999
	Güzel Sanatlar Fakültesi	6	5	11	0	0	0	6	5	11
	İktisat Fakültesi	447	536	983	450	380	830	897	916	1813
	İslami İlimler Fakültesi	35	58	93	55	55	110	90	113	203
	Mühendislik Fakültesi	418	229	647	0	0	0	418	229	647
	Tıp Fakültesi	189	167	356	0	0	0	189	167	356
	Turizm Fakültesi	9	6	15	0	0	0	9	6	15
	Fakülteler Toplamı	2554	3132	5686	1075	1116	2191	3629	4248	7877
	Fen Bilimleri Enstitüsü	157	86	243	0	0	0	157	86	243
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	19	10	29	0	0	0	19	10	29
	Sosyal Bilimleri Enstitüsü	292	133	425	0	0	0	292	133	425
	Enstitüler Toplamı	468	229	697	0	0	0	468	229	697
	GENEL TOPLAM		7473	6856	14329	3443	2286	5731	10916	9142

2015 Yılı sonu itibarıyla Üniversitemizde Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin toplamı 20.060'dır.

1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme:

Hedeflenen:


- Bağlantı Köprüsü, Eğitim Fakültesi Ek Bina, Mühendislik Fakültesi Binası, Adıyaman Evi, Enstitüler Binası, Teknik Bilimler MYO (1.Etap) binası yapılması.
- Deney Hayvanları Üretim Merkezi Binası yapılması.
- Kapalı yüzme havuzu yapımının tamamlanması,
- Stadyumun yapımına başlanması
- Önceki yıllardan devam eden yapım işlerinin tamamlanması,
- Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, Sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının iyileştirilmesi,
- Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi,
- Merkezi Araştırma Laboratuvarının cihaz alımının yapılması,
- İhtiyaç duyulan etüt-proje ve yeni bina proje hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi.

Gerçekleşen:

- Önceki yıllardan devam eden Bağlantı Köprüsü, Adıyaman Evi, Enstitüler Binası ve Kapalı Yüzme Havuzu yapımı tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.
- Dış Hekimliği Fakültemizin tıbbi cihaz ihtiyaçları karşılanmıştır.
- Atletizm pistli futbol sahası yapılmış olup, (1000 seyirci kapasiteli) tribün inşaatı çalışmaları devam etmektedir.
- Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, Sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının iyileştirilmesi sağlanmıştır.
- Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi sağlanmıştır.
- Doğal Gölet Projesi, Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Merkezi Projesi, BESYO Projesi, Uygulama Oteli Kat İlave Projesi işlerinin Mühendislik proje hizmet alımları gerçekleştirilmiştir.

Tertip	KBÖ	Toplam Ödenek	Harcama	Gerç.Oranı (%)
06.1 Mamul Mal Alımları	3.500.000	3.837.000	2.578.121	67
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	100.000	125.000	125.000	100
06.4 Gayrimenkul Kamulaştırılması	2.000	2.000	0	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.548.000	36.908.000	33.448.342	91
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	400.000	455.000	290.066	64
TOPLAM	25.550.000	41.327.000	36.441.530	88


2015 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılım Grafiği

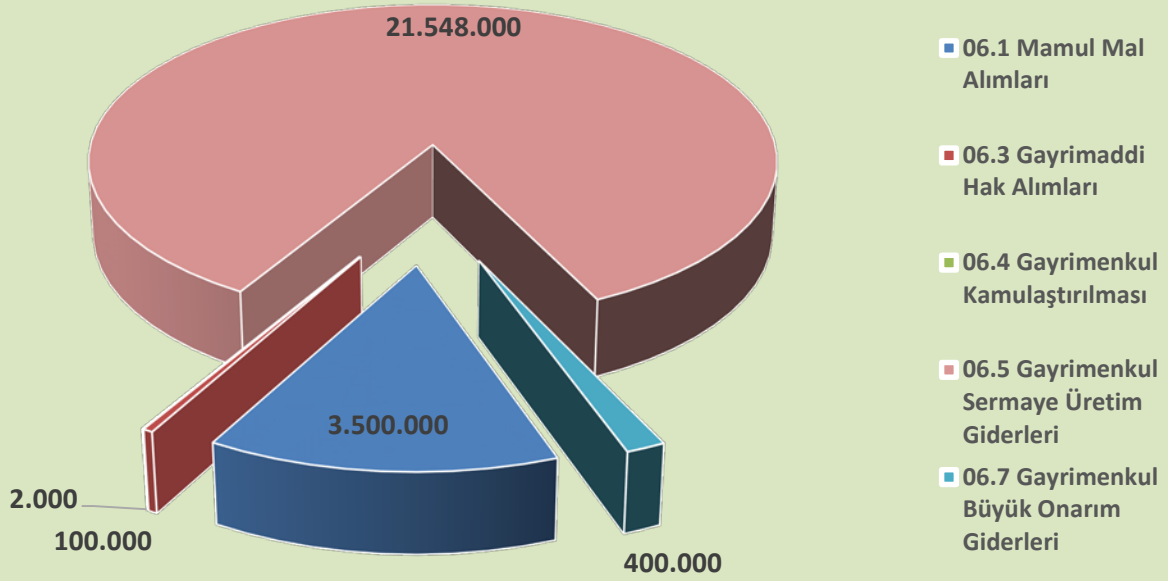

2015 YILI BİRİMLER YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI

BİRİM	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Diş Hekimliği Fakültesi	250.000,00	600.000,00	585.650,69	97,61
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	21.950.000,00	37.365.000,00	33.738.408,90	90,29
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	500.000,00	1.465.000,00	1.165.521,97	79,56
Kütüphane ve Doküman. Daire Başkanlığı	350.000,00	362.000,00	360.210,83	99,51
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2.500.000,00	1.535.000,00	591.737,94	38,55
TOPLAM	25.550.000,00	41.327.000,00	36.441.530,33	88,18

2015 YILI BİRİMLER YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI

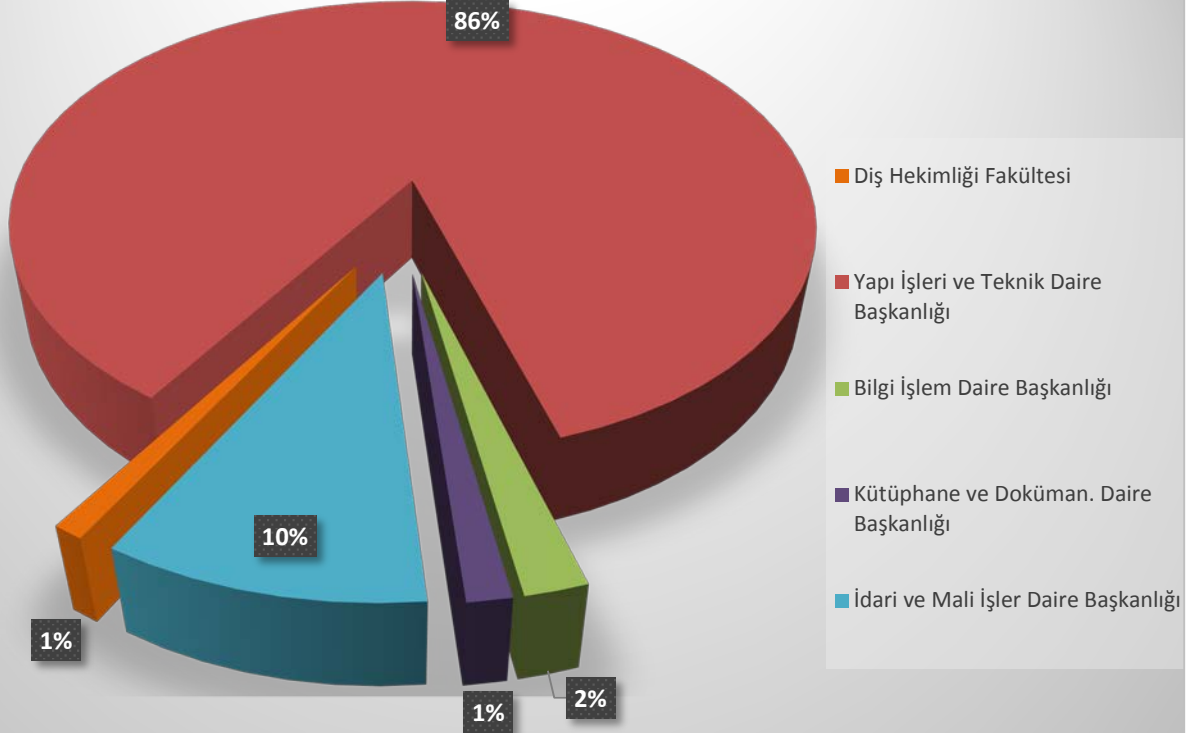

2

2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırımları Projeleri

EĞİTİM SEKTÖRÜ

1. 2015H030080 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2015 yılında proje tutarı olarak 200.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2014 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. Üniversitemizin programında olan yapım işlerine ait işlerin proje hizmet alımları ve güçlendirme çalışmalarına ait hizmet alımları gerçekleştirilerek yılsonu itibariyle 167.560,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında;

1. Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Merkezi Projesi
2. İslami İlimler Fakültesi Projesi
3. Hasancık İdari Bina Projesi
4. 1000 Seyircili Tribün Projesi

İşlerinin Mühendislik proje hizmet alımları gerçekleştirilmiştir.



Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Merkezi Binası Projesi



İslami ilimler Fakültesi Projesi



1000 Seyircili Tribün Projesi

2. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP)

Üniversitemizin Kampüs Alt Yapısı Projesine 2014 yılı itibariyle 32.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2015 yılında proje tutarı olarak 5.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılı kümülatif harcaması 22.400.400,00-TL'dir, yılsonu itibariyle 3.765.330,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında;

- 1- Adiyaman Evi Yapım İşi
- 2- Yeni Kampüs Alanı Alt Yapı Yapım İşi
- 3- 1-2-11-12 Nolu Yolların BSK ve Kaldırım Yapımı İşi
- 4- Bağlantı Köprüsü Yapımı
- 5- Hasancık İdari Bina Yapım İşi
- 6- Peyzaj Düzenleme ve Muhtelif işler gerçekleştirilmiştir.

Bu proje kapsamında Üniversitemiz kampüs altyapı çalışmaları kapsamında yeni kamulaştırılan alanlar ile mevcut kampüs içi yolların yapımı, kampüs elektrik altyapısının yapımı, kampüs içi su ve kanalizasyon altyapısı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.



Adiyaman Evi



Peyzaj Düzenlemesi

3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP)

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2015 yılı itibariyle proje tutarı olarak 121.500.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2014 yılı kümülatif harcaması 66.262.000,00-TL'dir. 2015 yılı ödenek toplamı 27.898.000,00-TL olup, yılsonu itibariyle 27.185.879,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında yürütülen işler:

- 1- Mühendislik Fakültesi Binası (İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor)
- 2- Teknik Bilimler MYO 1. Etap (İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor)
- 3- Enstitüler Binası (İş Bitti)
- 4- Eğitim Fakültesi Ek Bina (İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor)

Bu proje kapsamında yapılan işlerden; Mühendislik Fakültesi Binası, Teknik Bilimler M.Y. O Binası ve Eğitim Fakültesi Ek Binasının inşaat çalışmaları devam etmektedir.



Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı



Teknik Bilimler M.Y. O 1. Etap İnşaatı



Eğitim Fakültesi Ek Bina İnşaatı



Enstitüler Binası

4. 2015H030090 Muhtelif İşler (GAP) :

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2015 yılında proje tutarı olarak 3.400.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2014 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2015 yılı ödenek toplamı 3.400.000,00 TL olup, yılsonu itibarıyla bu ödenekten 2.047.326,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Üniversitemizin Akademik ve idari birimlerine bilgisayar, makine teçhizat ve donatım malzemesi ile yazılım alımları ile 2 adet taşıt (1 Kamyonet, 1 Binek araç) alımı gerçekleştirilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca 2015 Yılında Alımı Yapılan Malzemeler	
Malzeme Cinsi	Sayısı
Siber Tehdit Algılama Cihazı	1
Projeksiyon	6
Barkod Yazıcı	6
Kamera	90
Masaüstü Bilgisayar	95
Switch	10
Yazıcı	50
Tümleşik PC	15
Dizüstü Bilgisayar	178
Televizyon	3
TOPLAM	454

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 2015 Yılında Alımı Yapılan Malzeme Listesi	
Malzeme Cinsi	Sayısı
Akülü Zemin Temizleme Makinası	4
Konveksiyonel Fırın	1
Telefon	30
Minibüs	1
Binek Hizmet Aracı	1
Amfi Sıra	5
Mefruşat Malzemeleri	
TOPLAM	42

5. 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP):

Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2015 yılı itibariyle proje tutarı olarak 9.798.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2014 yılı kümülatif harcaması 6.177.554,00-TL'dir. 2015 yılı bütçe ödeneği olarak 990.000,00-TL tahsis edilmiş olup, yılsonu itibariyle yapılan harcama 974.000,00-TL'dir.

Bu proje kapsamında 18 Daireli Personel Lojman yapım işi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.



6. 2009H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP) :

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2014 yılı itibariyle proje tutarı olarak 19.470.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2014 yılı kümülatif harcaması 13.469.854,00-TL gerçekleşmiştir. 2015 yılı ödenek toplamı 2.300.000,00-TL olup, yılsonu itibariyle 881.000,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yine bu proje kapsamında önceki yıllarda yapılmış olan Atletizm Pistli Futbol Sahasına 1000 Seyirci Kapasiteli Tribün Yapım inşaat çalışmaları devam etmektedir.



Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı



Atletizm Pistli Stadyum

7. 2015H030100 Yayın Alımı Projesi (GAP):

Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine 2015 yılında proje tutarı olarak 350.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2014 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2015 yılı ödenek toplamı 362.000,00-TL olup, yılsonu itibariyle bu ödenekten 360.210,00 -TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Üniversitemiz 1.428 adet basılı yayın alımı ve 7 adet elektronik yayın aboneliği (ProQuest Dissertations and Theses, Ebrary, Türkiye Atıf Dizini, Scifinder, MathSciNet, Jstor ve Wiley) alımları gerçekleştirilmiştir.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

8. 2015I000020 Sağlık Projesi (GAP) :

Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Cihaz Alımı projesine 2015 yılında proje tutarı olarak 1.600.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2014 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. Yılsonu itibariyle 585.650,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi için tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiştir.

Diş Hekimliği Fakültesince 2015 Yılında Alımı Yapılan Malzeme Listesi	
Malzeme Cinsi	Sayısı
Diş Üniti	6
Tekerlekli Hasta Komidini	21
Hasta Taşıma Sandalyesi	5
Acil Müdahale Sandalyesi	2
Tıbbi ve Evsel Atık Konteyner	1
Reverse Ozmoz	1
TOPLAM	36

9. 2009I000150 Hastane İnşaatı Projesi (GAP) :

Üniversitemizin Hastane İnşaatı Projesine 2014 yılı itibariyle tamamlanmış olup tıbbi cihaz alımları da gerçekleştirilerek hizmete açılmıştır. Ancak 2015 yılında ödenmemiş hakediş alacaklarının ödenmesi amacıyla 475.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle 474.411,00-TL harcama yapılmıştır.

3

ÖNERİLER

- İlin Kültür- Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Yatırımlarının arttırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması,
- Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi,
- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitilmiş, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerin kısaltılması yönünde yasal düzenleme yapılması,
- Maliye Bakanlığınca Ayrıntılı Finansman Programının onaylanmasında yatırım ödeneklerinin inşaat mevsimi göz önünde bulundurularak serbest bırakma oranlarının ayarlanması,

2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe
2015 Yılı Fiyatlarıyla,

(Bin TL.)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama		2015 Yılı Program Ödenek		2015 Yılı Revize Ödenek		2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme					
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Eğitim	7	180.950	180.950		108.308	108.308		40.150	40.150				35.379	35.379	
Sağlık	3	2.075	2.075		0	0		2.075	2.075				1.059	1.059	
TOPLAM	10	183.025	183.025		108.308	108.308		42.225	42.225	0	0	0	36.438	36.438	

2015 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ

YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

(Bin TL.)

BİM NO	YSK	Proje No	PROJENİN ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUT. DIŞ.	PROJE TUT. TOP	2014 KÜMÜLATİF	ÖDENEK DIŞ KREDİ	ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK	ÖDENEK TOP.	+/-	AKTARMA MİKTARI	HARCAMA DIŞ KREDİ	HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK	HARCAMA TOPLAM
208185	436	2008H030250	KAMPÜS ALTYAPI	ÖZEL BÜTÇE	2016	Adıyaman	0	35.000	22.400	0	0	5.000			--	0	3.765
208188	436	2008H030260	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	ÖZEL BÜTÇE	2017	Adıyaman	0	121.000	66.262	0	0	27.898			--	0	27.185
201078	436	2010H030090	Lojman ve Sosyal Tesisler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Adıyaman	0	10.000	6.177	0	0	990			--	0	974
201094	436	2015H030080	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2015	Adıyaman	0	200	0	0	0	200	-		--	0	167
201124	436	2015H030090	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Adıyaman	0	3.400	0	0	0	3.400			--	0	2.047
201127	436	2015H030100	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2016	Adıyaman	0	350	0	0	0	362			--	0	360
212146	436	2009H050100	Açık ve Kapalı Spor tesisler	Özel Bütçe	2016	Adıyaman	0	11.000	13.469	0	0	2.300			--	0	881
TOPLAM								180.950	108.308	0	0	40.150			-	0	35.379

2015 YILI SAĞLIK SEKTÖRÜ

YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

(BİN TL.)

BİM NO	YSK	Proje No	PROJENİN ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUT. DIŞ.	PROJE TUT. TOP	2014 KÜMÜLATİF	ÖDENEK DIŞ KREDİ	ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK	ÖDENEK TOP.	+/-	AKTARMA MİKTARI	HARCAMA DIŞ KREDİ	HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK	HARCAMA TOPLAM
191883	436	2015I000020	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Adıyaman	0	600	0	0	0	600				0	585
200332	436		Muhtelif İşler	Döner Sermaye	2015	Adıyaman	0	1.000	0	0	0	1.000				0	0
	436	2009I000150	Hastane 2. Etap (Bakiye Borcu)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Adıyaman	0	475	0	0	0	475				0	474
TOPLAM								2.075	0	0	0	2.075	-	0		0	1059
